


# サンドマスチックへの海草の繁茂状態

日本海上工事㈱

1. 場 所： 関西電力㈱高浜発電所造成護岸
2. 施工時期： 昭和54年10月～昭和55年4月
3. 状 態： サンドマスチック施工後、約0.5ヵ月後経過から海草の付着が始まるのが目視出来るようになり約3ヵ月後写真のような繁茂状態となった。  
— 同時期施工されたコンクリートブロックと比較するとかなり早く付着することが分かる —

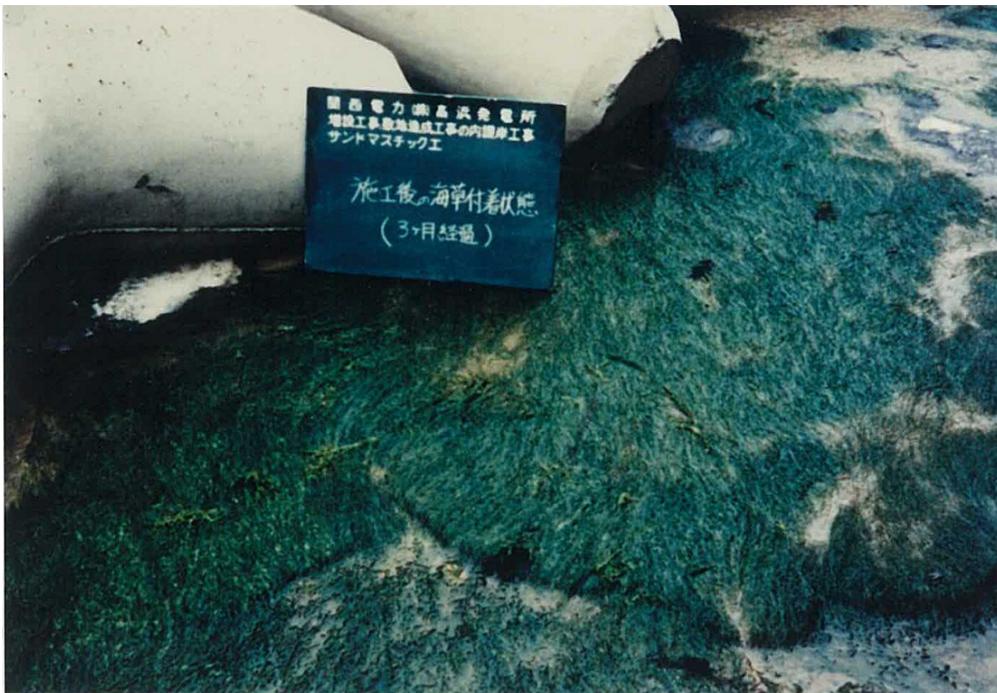

写真：サンドマスチックへの海草の繁茂状態  
(3ヶ月経過)
